



DIPARTIMENTO VII°- SERVIZIO 2°
Viabilità zona sud

S.P. CIRCONVALLAZIONE GERANO km 1+400

**Lavori di somma urgenza per il ripristino delle condizioni di sicurezza a seguito di smottamento in atto e posa di rete paramassi al km 2+000
Art 176 del DPR 207/10**

DATA :


02 MAG. 2013

AGGIORNAMENTO

TAV. 1

DISEGNATORE

SCALA

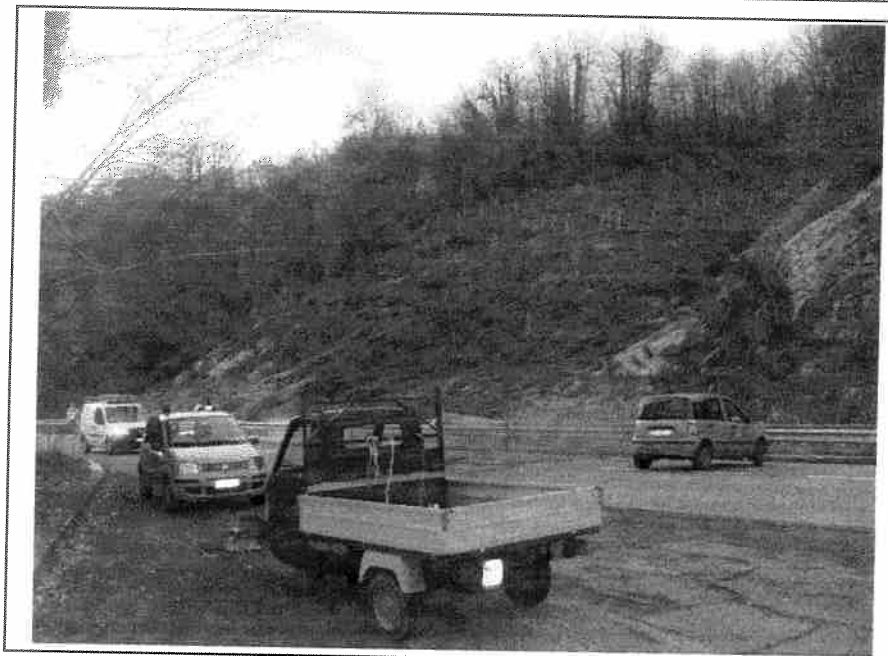

I COLLABORATORI

Geom. P. BECCARINI

Geom. M. BRUGNOLI

Geom. G. FRATTICCI

Geom. L. ROMANO

PROGETTO ESECUTIVO

VERBALE DI SOMMA URGENZA

IL PROGETTISTA
(F.S.T. Geom. Giuseppe TEMPERINI)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 2°
Dott. Ing. Antonio CELLUCCI



Provincia di Roma

Dipartimento VII
Servizio n.2 Viabilità sud

OGGETTO: S.P. CIRCONVALLAZIONE GERANO km 1+400

Lavori di somma urgenza per il ripristino delle condizioni di sicurezza a seguito di smottamento in atto e posa di rete paramassi al km 2+000.

Art. 176 DPR 207/'10

VERBALE DI SOMMA URGENZA

Premesso che:

- al km 1+400 circa della S.P. CIRCONVALLAZIONE GERANO a seguito di piogge particolarmente intense, si è verificato l'indebolimento del versante a monte che insiste sul tratto di strada sopra citato, che ha provocato consistenti abbassamenti del terreno che fiancheggia la provinciale
- a seguito dei sopralluoghi e degli accertamenti effettuati tempestivamente dal Servizio Geologico provinciale, risultava esistere una situazione di rilevante precarietà del versante e della parete, e per tali motivi veniva emessa *ordinanza di chiusura al traffico veicolare n° 04/2013*.

A seguito dei predetti accertamenti, effettuati in data 15/03/2013 ed il 03/04/2013 e successivamente in data 12/04/2013 il Servizio Geologico Provinciale comunicava i provvedimenti consigliati per la bonifica del versante sulla **S.P. CIRCONVALLAZIONE GERANO**, constatando che la situazione di instabilità del versante al km 1+400 e della parete tufacea al km 2+000, richiedeva un intervento immediato al fine di mettere in sicurezza il tratto di strada interessato.

Per rimuovere l'immediato stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, in data **22/04/2013** viene affidato l'incarico di eseguire i necessari lavori alla Impresa **ISAM s.r.l.**, risultata la 1^a delle Imprese sorteggiate dall'Ufficio gare.

Nell'intervento da eseguire con somma urgenza si realizzeranno esclusivamente le opere necessarie per eliminare le situazioni di pericolo per la pubblica incolumità da cui è scaturita la ordinanza di chiusura consiste: *al km 1+400 scavi, realizzazione di drenaggi con "gabbiodren", posa in opera di tubazioni PE-AD e scheggioni di cava per i drenaggi, idrosemina e piantumazione di essenze arboree ; al km 2+000 rilevamento puntuale delle masse rocciose, e rivestimento delle stesse con rete con maglia metallica a doppia torsione.*

Gerano li 22/04/2013

IL PROGETTISTA

F.S.T. Geom Giuseppe TEMPERINI

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Responsabile del procedimento
(Dott/Ing. Antonio CELLUCCI)
